



# **PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

Assessorato Territorio e Ambiente - 16° Settore "Pianificazione del Territorio"

protocollo n. 21086 del 10 aprile 2008


**PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA**

**C.C.I.A.A. DI RAGUSA**

**CONSORZIO A.S.I DI RAGUSA**

**COMUNI DI**

**Acate  
Comiso  
Chiaromonte Gulfi  
Giarratana  
Ispica  
Modica  
Monterosso Almo  
Pozzallo  
Ragusa  
S.Croce Camerina  
Scicli  
Vittoria;**

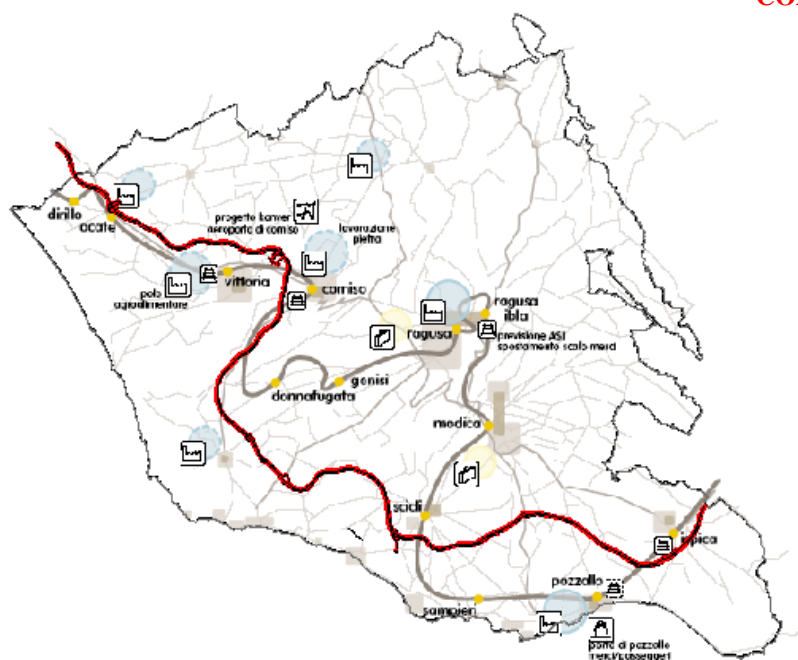

## **2° RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

per l'utilizzo dei fondi "ex-Insicem" destinati a favorire  
lo sviluppo del tessuto imprenditoriale ibleo

# SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	2
<b>2. IL PIANO DI UTILIZZO</b> .....	3
<b>3. L'ACCORDO DI PROGRAMMA</b> .....	6
<b>4. LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO</b> .....	8
<b>4.1. Azioni strategiche</b> .....	9
4.1.1 - Sostenere l'adesione dei Comuni e della Provincia al protocollo di Agenda 21 .....	9
4.1.2 - Completamento e riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali .....	10
4.1.3 - Potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi .....	12
4.1.4 - Riequilibrio economico e sociale zona montana .....	16
4.1.5 - Istituzione di un fondo di rotazione di sostegno .....	17
4.1.6 - Adeguamento delle realtà produttive locali .....	19
4.1.7 - Favorire lo sviluppo socio-economico del territorio .....	20
4.1.8 - Favorire con sistema ed efficacia la gestione dei fondi ex-Insicem .....	21
<b>5. CONCLUSIONI</b> .....	21
<b>ALLEGATI</b> .....	23
allegato A: Tabella contabile riepilogativa	
allegati B: richiesta relazione di cui all'art.13	
allegati C: riscontro ex art.13	

# UTILIZZO DEI FONDI EX-INSICEM

(art. 77 della Legge Regionale 3 maggio 2001 n.6 e ss. mm. ed ii.)

## **SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 26 LUGLIO 2006**

### **1.PREMESSA**

L'art. 77 L.R. 6/01, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 2/02 prevede al comma 1 che "Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), dell'Ente Siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione Siciliana per essere destinate dalla Giunta regionale, sentita la commissione attività produttive dell'Assemblea regionale siciliana, a spese di investimento per la realizzazione di opere infrastrutturali e interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente dei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti indicati..." -.

In accordo all'art.11, comma 2, della L.R. 05.11.2004, per quanto riguarda la Provincia di Ragusa le risorse a disposizione ammontano a circa 58 milioni di euro.

Al fine di definire un piano per utilizzare tali fondi, a seguito di concertazione allargata a tutti gli attori dello sviluppo locale (istituzioni, associazioni imprenditoriali e sindacali) e con il supporto di un tavolo tecnico appositamente costituito, è stato elaborato un apposito "**Piano di utilizzo**", comprendente un insieme organico di azioni di sostegno strutturale e di potenziamento infrastrutturale all'interno della quale i fondi ex-Insicem assicurano il soddisfacimento certo ed immediato delle azioni prioritarie e costituiscono contemporaneamente un forte elemento propulsivo per la attivazione di ulteriori risorse.-

In attuazione di tale strategia, il Piano prevede un articolata serie di interventi per un investimento complessivo di 270.228.700 Euro, di cui 59.781.000 Euro a valere proprio sui saldi di liquidazione di cui all'art.77 della L.R. 03.05.2001, n. 6, e ss. mm. ed ii.:-

Per quanto riguarda la rimanente quota di risorse necessarie all'attuazione del Piano, con Deliberazione n.602 del 22.12.2005 la Giunta Regionale di Governo determinava di approvare la ipotesi di un apposita intesa Stato-Regione, finalizzata proprio alla integrazione dei fondi ex art.77 della L.R. 03.05.2001;

Nelle more della completa copertura del complessivo quadro finanziario da realizzarsi anche attraverso l'eventuale attivazione degli strumenti di intesa Stato-Regione previsti dalla accennata Delibera G.R.G. n.602 del 22.12.2005, al fine di favorire l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi ex-Insicem ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate alla Provincia di Ragusa ai sensi dell'art.11 della L.R. 15/2004, tra tutti i soggetti attuatori in data 26.07.2006, è stato stipulato un **"Accordo di Programma"** ove vengono stabiliti tempi e modalità per assicurare la massima efficacia procedurale nell'impiego delle risorse.

In accordo all'art.34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il predetto Accordo di Programma è stato approvato del Presidente della Provincia con proprio provvedimento n.42844/173RP/4042RG del 01.08.2006, e successivamente pubblicato sulla G.U.R.S. della Regione Siciliana - Parti II e III - n.38 del 22.09.2006

Come previsto dall'art.14, la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e, in rappresentanza dei soggetti attuatori, dai sindaci dei comuni di Comiso, Giarratana, Modica e Ragusa, nonché dal Presidente del Consorzio ASI e dal Presidente della C.C.I.A.A..

Il Collegio, almeno una volta l'anno, procede all'esame del rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.

A tal fine il Soggetto responsabile dell'attuazione relaziona entro il 31 marzo di ogni anno.

## **2. IL PIANO DI UTILIZZO**

La strategia, delineata nel Piano di Utilizzo, è costituita da un vero e proprio progetto integrato che, attraverso un insieme organico di azioni di sostegno strutturale e di potenziamento infrastrutturale, concretizzi una ipotesi allargata di intervento finalizzata allo

sviluppo dell'intero sistema produttivo ibleo, all'interno del quale le risorse ex-Insicem rivestono una duplice valenza di:

1. assicurare il soddisfacimento certo e immediato di alcune azioni prioritarie;
2. costituire un forte elemento propulsivo per l'attivazione di ulteriori risorse.

L'investimento complessivo previsto per il progetto è di oltre 270 milioni di euro e sarà finanziato come segue:

• Fondi ex-Insicem .....	€ 59.781.000,00
• Finanziamenti privati .....	€ 18.566.000,00
• Altri finanziamenti .....	<u>€191.881.700,00</u>
Totale complessivo .....	€270.228.700,00

### Interventi ed azioni

Nel piano di utilizzo vengono individuati otto obiettivi strategici da raggiungere con gli interventi di seguito riportati:

1. Sostenere l'adesione dei Comuni e della Provincia al protocollo di Agenda 21:
  - *Formazione personale P.A. nel campo della tutela e sostenibilità ambientale*
  - *Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento*
2. Completamento e riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali :
  - *Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi con l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria.*
  - *Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di Pozzallo.*
  - *Collegamento ferroviario all'aeroporto di Comiso.*
  - *Nuovo scalo merci a Ragusa.*
  - *Collegamento ferroviario al porto di Pozzallo.*
  - *Nuovo scalo merci porto di Pozzallo*
3. Potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno dello sviluppo delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e commerciali:
  - *Interventi di ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva dell'A.S.I. di Ragusa*
  - *Interventi di completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di Modica-Pozzallo*
  - *Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo polo industriale*
  - *Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana*

- *Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso Almo*
  - *Realizzazione insediamento produttivo in Comune di Scicli*
  - *Realizzazione area PIP in Comune di Acate*
  - *Realizzazione area PIP in Comune di Comiso*
  - *Realizzazione di area PIP in Comune di Ispica (\*)*
  - *Realizzazione area PIP in Comune di Pozzallo*
  - *Realizzazione area PIP in Comune di Ragusa.*
  - *Ampliamento area PIP in Comune di Modica e potenziamento della relativa viabilità di accesso (\*)*
  - *Realizzazione nuova area PIP in Comune di Modica*
  - *Intervento sul frigomacello di Ragusa*
  - *Completamento del Foro Boario di Ragusa*
  - *Completamento centro servizi zona artigianale di Comiso.*
4. Interventi volti a favorire il riequilibrio economico e sociale tra la zona montana della provincia e la fascia trasformata, quali l'acquisizione e messa a reddito di porzioni di territori marginali e/o in stato di abbandono o di sottoutilizzazione:
- *Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano (Giarratana, Monterosso, Chiaramonte e Ragusa)*
5. Istituzione di un fondo di rotazione a sostegno della capitalizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese della Provincia di Ragusa, mediante interventi sul capitale di rischio delle stesse:
- *Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle imprese mediante interventi nel capitale di rischio*
  - *Istituzione di un fondo per interventi nel fondo rischi dei confidi che finanziano progetti di sviluppo*
  - *Istituzione di un fondo per interventi in conto interessi*
6. Interventi volti a favorire l'adeguamento delle realtà produttive locali (PMI) verso processi produttivi sostenibili e innovativi:
- *Adozione di sistema di qualità e di gestione ambientale, certificazioni e innovazione.*
  - *Adozione di nuove tecnologie per l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e commercializzazione.*
  - *Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle colture protette e dell'agroalimentare*
  - *Sostegno di progetti di promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero*
7. Interventi volti a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio in forma sostenibile, rafforzandone l'identità culturale umanitaria e l'attrattività per investimenti e risorse "esterne":

- *Attuazione di azioni di marketing territoriale finalizzate alla promozione dell'offerta locale, alla internazionalizzazione delle imprese che operano con approccio di sviluppo sostenibile, ed alla attrazione di investimenti.*
- *Attivazione di centri di competenza al fine di supportare le PMI nei processi di riorganizzazione coerenti con gli obiettivi dello sviluppo socio economico della Provincia di Ragusa.*

8. Favorire con sistema ed efficacia la gestione dei fondi ex-Insicem.

- *Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto (\*)*

### **3. L'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Ai sensi dell'art.11, secondo comma, della L.R. 15/2004, come sostituito dall'art. 20, comma 23, della L.R. 22.12.2005, n.19, l'Assessorato regionale dell'industria veniva autorizzato a trasferire alla Provincia regionale di Ragusa gli importi relativi alle azioni strategiche da realizzare, quali previste dall'apposito "Piano di utilizzo" già approvato dalla Giunta Regionale e, con D.D.G. n.2530 del 18.11 .2005, il Dipartimento Industria impegnava, la predetta somma di Euro 58.000.000 a favore della Provincia Regionale al capitolo 642418 del bilancio della Regione Sicilia - rubrica Dipartimento Industria - esercizio finanziario 2005;-

Nella considerazione che gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse ex-Insicem (certe ed immediatamente accessibili) rivestono una autonoma collocazione funzionale che prescinde dalla accessibilità o meno alle ulteriori risorse di parte pubblica, nelle more che vengano reperite le ulteriori risorse previste nel Piano di utilizzo approvato dalla Giunta Regionale di Governo, tra i soggetti attuatori degli interventi è stato sottoscritto l'Accordo di programma, di cui in premessa, finalizzato a favorire l'attuazione degli interventi finanziati con i fondi ex-Insicem ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate.

A fronte di un importo complessivo, che il "Piano di utilizzo" prevede in Euro 59.781.000 a valere sui saldi di liquidazione di cui all'art.77 della Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, l'importo effettivamente stanziato per la finalità dall'art.11 della Legge Regionale 5 novembre 2004. n. 15, è pari ad Euro 58.000.000 e quindi con una differenza di 1.781.000 Euro, che si è ritenuto di dovere recuperare diminuendo proporzionalmente gli importi dei singoli interventi, come da tabella seguente:

<i>Importi in euro</i>				
	<b>INTERVENTO</b>	<b>PIANO UTILIZZO</b>	<b>QUOTA FONDI EX INSICEM</b>	<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>
		1	2	3
<b>1</b>	<b>SOSTENERE L'ADESIONE DI COMUNI E DELLA PROVINCIA AD AGENDA 21</b>			
1	Formazione personale P.A. nel campo della tutela e sostenibilità ambientale	50.000,00	48.510,40	Provincia Regionale
2	Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento	50.000,00	48.510,40	Provincia Regionale
		<b>100.000,00</b>	<b>97.020,79</b>	
<b>2</b>	<b>COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI COLLEGAMENTI INFRATRUTTURALI</b>			
1	Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi con l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria	17.500.000,00	16.978.638,70	Provincia Regionale
2	Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di Pozzallo	5.000.000,00	4.851.039,63	Provincia Regionale
		<b>22.500.000,00</b>	<b>21.829.678,33</b>	
<b>3</b>	<b>POTENZIAMENTO DELLE AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
1	Interventi di ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva dell'A.S.I. di Ragusa	6.100.000,00	5.918.268,35	Consorzio A.S.I.
2	Interventi di completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di Modica-Pozzallo	5.220.700,00	5.065.164,52	Consorzio A.S.I.
3	Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo polo industriale	6.813.000,00	6.610.026,60	Consorzio A.S.I.
4	Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana	1.000.000,00	970.207,93	Comune di Giarratana
5	Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso Almo	1.000.000,00	970.207,93	Comune di Monterosso Almo
6	Realizzazione insediamento produttivo in Comune di Scicli	1.500.000,00	1.455.311,89	Comune di Scicli
7	Realizzazione area PIP in Comune di Acate	700.000,00	679.145,55	Comune di Acate
9	Realizzazione di area PIP in Comune di Ispica (*)	0,00	0,00	Comune di Ispica
12	Ampliamento area PIP in Comune di Modica e potenziamento della relativa viabilità di accesso (*)	0,00	0,00	Comune di Modica
13	Realizzazione nuova area PIP in Comune di Modica	1.500.000,00	1.455.311,89	Comune di Modica
14	Intervento sul frigomacello di Ragusa	1.500.000,00	1.455.311,89	Comune di Ragusa
15	Completamento del Foro Boario di Ragusa	1.000.000,00	970.207,93	Comune di Ragusa
		<b>26.333.700,00</b>	<b>25.549.164,45</b>	
<b>4</b>	<b>RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE MONTANO</b>			
1	Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano (Giarratana, Monterosso, Chiaramonte e Ragusa)	1.750.000,00	1.697.863,87	Provincia regionale
		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.697.863,87</b>	



<b>5</b>	<b>ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE DI SOSTEGNO</b>			
1	Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle imprese mediante interventi nel capitale di rischio	2.000.000,00	1.940.415,85	Provincia Regionale e C.C.I.A.A.
		2.000.000,00	1.940.415,85	
2	Istituzione di un fondo per interventi nel fondo rischi dei confidi che finanziano progetti di sviluppo	2.000.000,00	1.940.415,85	
3	Istituzione di un fondo per interventi in conto interessi	2.000.000,00	1.940.415,85	
		<b>8.000.000,00</b>	<b>7.761.663,40</b>	
<b>6</b>	<b>FAVORIRE L'ADEGUAMENTO DELLE REALTA' PRODUTTIVE LOCALI</b>			
3	Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle colture protette e dell'agroalimentare	900.000,00	873.187,13	Provincia Regionale
4	Sostegno di progetti di promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero	100.000,00	97.020,79	Provincia Regionale
		<b>1.000.000,00</b>	<b>970.207,93</b>	
<b>7</b>	<b>FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL TERRITORIO</b>			
<b>8</b>	<b>FAVORIRE CON SISTEMA DI EFFICIENZA ED EFFICACIA LA GESTIONE DEI FONDI EX INSICEM</b>			
1	Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto (*)	97.300,00	94.401,23	Provincia Regionale
		<b>97.300,00</b>	<b>94.401,23</b>	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>59.781.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	
<b>NOTE: - (*) Interventi da attuare con l'impiego prioritario dei ribassi d'asta</b>				

#### 4. LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Con la pubblicazione dell'Accordo di Programma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'attuazione di quanto previsto nello stesso, è stata concretamente avviata.-

Su richiesta di questa Provincia, nella qualità di soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, i soggetti attuatori hanno designato e comunicato il nominativo del Responsabile dell'intervento/i di competenza.

Alcuni soggetti attuatori hanno già espletato quanto necessario per procedere all'impegno delle somme, alcuni hanno già avviato i lavori, che in qualche caso sono sostanzialmente ultimati.

Ad oggi, risultano essere state impegnate somme pari ad **euro 15.902.450,51** ed erogate somme per **euro 1.367.263,53**; per il riepilogo generale si rimanda alla tabella contabile

riepilogativa (allegato 'A'), mentre per lo stato di attuazione di ogni singolo intervento si rimanda a quanto di seguito riassunto.

In accordo all'art.13 dell'Accordo di programma ed in concomitanza delle scadenze dei monitoraggi annuali, i Responsabili della realizzazione degli interventi trasmettono entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione utile al monitoraggio.

#### **4.1 Le Azioni strategiche**

##### **Azione strategica n.1:**

Sostenere l'adesione dei Comuni e della Provincia al protocollo di Agenda 21:

**Finalità:** promuovere e adeguare alle nuove necessità le capacità di progettazione, implementazione, monitoraggio e valutazione degli operatori della P.A. nel campo ambientale.

##### *1 sub1- Formazione personale P.A. nel campo della tutela e sostenibilità ambientale*

L'intervento intende sostenere il processo di innovazione in atto nella pubblica amministrazione, fornendo gli strumenti per dotare la stessa di quelle professionalità necessarie al decollo di nuovi processi e modelli culturali.

Quota fondo ex-Insicem: €48.510,40

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore VII

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

**Stato dell'attuazione:** Il competente settore dell'Amministrazione sta organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche avvalendosi di specialisti del settore.

*1 sub2- Informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento*

L'intervento intende contribuire a colmare le carenze di figure professionali che sono richieste per lo svolgimento efficace dell'azione della pubblica amministrazione provinciale e locale, riqualificando il personale verso una migliore capacità progettuale e di valutazione delle politiche di intervento pubbliche e delle opportunità di finanziamento di fonte comunitaria, nazionale e regionale a favore di amministrazioni locali

Quota fondo ex-Insicem: €48.510,40

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore VII

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Il competente settore dell'Amministrazione sta organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche avvalendosi di specialisti del settore.

**Azione strategica n.2:**

Completamento e riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali :

Finalità: Il potenziamento delle vie di comunicazione costituisce per la Provincia di Ragusa, anche e soprattutto in ragione della sua collocazione geografica estremamente periferica rispetto alle dorsali nazionali del trasporto su gomma e ferroviario e dei collegamenti del tutto insoddisfacenti con gli scali aeroportuali più prossimi, una delle azioni di maggiore valenza strategica, certamente determinante per i volumi di traffico commerciale e per la attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi locali.

*2 sub1 - Realizzazione della bretella di collegamento SS 115 - SS 514 e dei rispettivi raccordi con l'aeroporto di Comiso e con l'autoporto di Vittoria*

L'intervento consente il collegamento viario fra la "direttrice pedemontana" (S.S. 115 – asse autostradale), il polo di Comiso-Vittoria, comprendente non solo gli omonimi agglomerati urbani ma anche un forte apparato produttivo (mercato orto-flori-frutticolo di Vittoria e polo lapideo di Comiso), il nuovo aeroporto ex base

Nato, il nuovo autoporto di Vittoria e la SS.514, principale asse di collegamento stradale fra la due Province di Ragusa e Catania.

Quota fondo ex-Insicem: €16.978.638,70

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI

Somme impegnate: €1.832.000,00

Somme erogate: €32.791,16

Stato dell'attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente € **1.854.098,80** di cui:

- €25.098,80 come anticipazione per le indagini geognostiche e geotecniche;
- €1.820.000,00 come spesa prevista per indire la gara di affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori e annesse prestazioni speciali ed accessorie.
- € 9.000,00 per il rimborso spese per il componente esterno nominato nella commissione di gara

La gara ad evidenza pubblica è stata avviata in data 27.03.2007 con l'insediamento dell'apposita Commissione, i cui lavori si sono conclusi in data 25.05.2007. E' risultato aggiudicatario della gara un raggruppamento di operatori economici con mandataria "Studio Ingegneria Stradale s.r.l." che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 30,00%. L'iter progettuale procede secondo i tempi prefissati, salvo per una proroga di 60 gg necessaria per tenere conto delle osservazioni fatte in merito al tracciato dall'Ufficio Regionale che si occupa della VIA. Allo stato Il gruppo di progettazione ha consegnato il progetto preliminare e lo studio di prefattibilità ambientale.

#### *2 sub2 - Riassetto dei collegamenti vari autostrada - porto di Pozzallo*

L'intervento si prefigge di ottimizzare il collegamento viario fra la S.S. 115 in corrispondenza del polo di Ispica, la nuova tratta autostradale che attraversa la Provincia fra Ispica e Pozzallo, e l'agglomerato di Pozzallo, comprendente sia le aree consortili A.S.I. che la omonima struttura portuale.- Attualmente lungo tale direttrice il transito stradale è assicurato dalla vecchia S.P. n.46 Ispica – Pozzallo, la quale è già oggi insufficiente a sostenere gli attuali volumi di transito.

Quota fondo ex-Insicem: €4.851.039,63

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVII

Somme impegnate: 843.941,70

Somme erogate: 18.651,30

Stato dell'attuazione: Sulla base del Documento Preliminare sulla Progettazione, predisposto dal Settore Viabilità della Provincia, è previsto un intervento generale dell'importo presumibile di euro 8.521.000,00, all'interno del quale le risorse ex-Insicem verranno utilizzate per la realizzazione del lotto funzionale riguardante il collegamento diretto Autostrada – Porto.

La gara ad evidenza pubblica è stata avviata in data 23.10.2007 con l'insediamento dell'apposita Commissione, i cui lavori si sono conclusi in data 06.12.2007. E' risultato aggiudicatario della gara un raggruppamento di operatori economici con capogruppo "Technital s.p.a." che ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 36,35%. Allo stato, per completare l'affidamento del servizio, si stanno verificando i requisiti dell'aggiudicatario per rendere efficace l'aggiudicazione definitiva.

### **Azione strategica n.3:**

Potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno dello sviluppo delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e commerciali:

**Finalità:** Il potenziamento delle aree attrezzate per gli insediamenti produttivi a sostegno dello sviluppo delle attività produttive industriali, agricole, artigianali e commerciali, dotandole dei servizi e delle opere di urbanizzazione necessarie a supporto dell'attività economica e commerciale così da massimizzare la produttività ed indirettamente la redditività dei soggetti economici locali.

#### *3 sub1 - Interventi di ampliamento ed urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva dell'A.S.I. di Ragusa*

L'intervento consente l'ampliamento ed l'urbanizzazione dell'area di insediamento produttiva dell'A.S.I. di Ragusa.

Quota fondo ex-Insicem: €5.918.268,35

Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Geom. Sergio Salonia

Somme impegnate: €5.918.268,35

Somme erogate: €588.686,36

Stato dell'attuazione: Relazione esplicativa di cui all'art.13 non pervenuta. Risulta un impegno complessivo di di €5.918.268,35 di cui €762.184,00 per la realizzazione della strada di accesso dalla zona ex ZIR alla 1^ fase (progetto esecutivo) e di €5.276.985,00 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della IV E V fase (progetto definitivo).

I lavori per la realizzazione della strada di accesso della zona ex ZIR alla 1^ fase sono quasi del tutto ultimati e allo scopo sono stati erogati €588.686,36.

*3 sub2 - Interventi di completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di Modica-Pozzallo*

L'intervento consente il completamento opere di urbanizzazione Agglomerato di Modica-Pozzallo

Quota fondo ex-Insicem: €5.065.164,52

Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Geom. Sergio Salonia

Somme impegnate: €5.065.164,52

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Risulta un impegno complessivo di di €5.065.164,52 di cui €1.620.860,54 per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria della II fase (progetto definitivo) e di €3.444.303,43 per i lavori di completamento della viabilità di lottizzazione - 1° stralcio (progetto esecutivo). Relativamente a quest'ultimo progetto è stata già espletata la gara e stipulato il contratto. E' risultata aggiudicataria la ditta Merbi srl di Nicosia (EN) che ha offerto un ribasso del 7.136%. In data 31.01.2008 sono stati consegnati i lavori, che devono essere completati entro il 10.12.2009.

*3 sub3 - Realizzazione aree di insediamento produttivo terzo polo industriale*

L'intervento consente l'istituzione del terzo polo industriale della provincia.

Quota fondo ex-Insicem: €6.610.026,60

Soggetto attuatore: Consorzio ASI di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Ing. Franco Poidomani

Somme impegnate: €230.727,19

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Il piano regolatore per l'istituzione del terzo polo industriale è stato approvato dal competente Assessorato Regionale con Decreto 15 novembre 2007 (G.U.R.S. n.57 del 07.12.2007).

In ordine ai lavori infrastrutturali, il Consorzio ha avviato le procedure per la progettazione delle aree ricadenti nei comuni di Vittoria (importo complessivo previsto €4.555.000,00), Santa Croce Camerina (importo complessivo previsto € 2.586.000,00) e di Chiaramonte Gulfi (importo complessivo previsto € 2.299.000,00). Per le suddette progettazioni sono stati impegnati €230.727,19.

*3 sub4 - Realizzazione area PIP in Comune di Giarratana*

L'intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Giarratana.

Quota fondo ex-Insicem: €970.207,93

Soggetto attuatore: Comune di Giarratana

Responsabile per la realizzazione: Ing. Biagio Alderisi

Somme impegnate: €639.600,00

Somme erogate: €533.916,04

Stato dell'attuazione: Relazione esplicativa di cui all'art.13 non pervenuta. E' stata già avviata la realizzazione di uno stralcio funzionale dell'area PIP prevista. Le somme erogate riguardano i costi di esproprio e gli stati di avanzamento delle opere di urbanizzazione dello stralcio. Recentemente il Comune ha avanzato richieste circa l'impegno delle restanti somme disponibili.

*3 sub5 - Realizzazione area PIP in Comune di Monterosso Almo*

L'intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Monterosso Almo.

Quota fondo ex-Insicem: €970.207,93

Soggetto attuatore: Comune di Monterosso Almo

Responsabile per la realizzazione: Geom. Paolo Amato

Somme impegnate: €970.200,00

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Risulta un impegno complessivo di € 970.200,00 per la realizzazione di uno stralcio dell'area artigianale di n.6 lotti (progetto esecutivo). Allo stato sono in avanzata fase le procedure per l'acquisizione delle aree mediante procedura espropriativa con oneri a totale carico dell'Amministrazione comunale.

*3 sub6 - Realizzazione insediamento produttivo in Comune di Scicli*

L'intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Scicli.

Quota fondo ex-Insicem: €1.455.311,89

Soggetto attuatore: Comune di Scicli.

Responsabile per la realizzazione: Ing. Guglielmo Spanò

Somme impegnate: €-----

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Relazione esplicativa di cui all'art.13 non pervenuta.  
Per tale intervento in seno al Consiglio comunale si è sviluppata una discussione in merito alla destinazione della somma stanziata. Del caso si è occupato il Collegio di Controllo nella seduta del 17.09.2007.

*3 sub7 - Realizzazione area PIP in Comune di Acate*

L'intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Acate.

Quota fondo ex-Insicem: €679.145,55

Soggetto attuatore: Comune di Acate

Responsabile per la realizzazione: Geom. Gianni Coniglione

Somme impegnate: €679.145,55

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Risulta che i lavori relativi alle "Opere di urbanizzazione primaria della zona di insediamento artigianale del P.P. ambito 3" (importo del progetto esecutivo pari a €3.381.000,00) sono stati aggiudicati in data 08.01.2007 alla ditta C&C Costruzioni con un ribasso del 7,321%. I lavori sono iniziati il 24.05.2007 e risultano eseguiti per circa il 34%. Ad oggi sono stati impegnati € 675.145,55 come cofinanziamento.

*3 sub13 - Realizzazione area PIP in Comune di Modica*

L'intervento consente la realizzazione di un area PIP nel Comune di Modica

Quota fondo ex-Insicem: €1.455.311,89

Soggetto attuatore: Comune di Modica

Responsabile per la realizzazione: Ing. Giuseppe Patti

Somme impegnate: €-----

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Relazione esplicativa di cui all'art.13 non pervenuta.



*3 sub14 - Intervento sul frigomacello di Ragusa*

Quota fondo ex-Insicem: €1.455.311,89

Soggetto attuatore: Comune di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Ing. Carmelo Licitra

Somme impegnate: €72.765,59

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Con la relazione trasmessa in data 28.03.2007 veniva comunicata l'intenzione di rimodulare l'intervento al fine di un ampliamento e di un integrazione con la filiera delle energie rinnovabili. Si prevedeva a tal fine l'apporto di capitali privati tramite progetto di finanza. In data 21.12.2007 è stato richiesto l'utilizzo dell'anticipo del 5% per dare corso alla progettazione delle opere di completamento del Frigomacello, trasmettendo un quadro economico con un importo preventivato di progetto pari complessivamente a €1.500.000,00. A tale scopo è stata impegnata una somma di €72.765,59. E' in corso di formalizzazione l'affidamento dell'incarico per la progettazione.

*3 sub15 - Completamento del Foro Boario di Ragusa*

Quota fondo ex-Insicem: €970.207,93

Soggetto attuatore: Comune di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Ing. Giuseppe Corallo

Somme impegnate: €48.510,40

Somme erogate: €-----

Stato dell'attuazione: Relazione esplicativa di cui all'art.13 non pervenuta. In data 21.12.2007 è stato richiesto l'utilizzo dell'anticipo del 5% per dare corso alla progettazione delle opere di completamento del Frigomacello, trasmettendo un quadro economico con un importo preventivato di progetto pari complessivamente a €1.000.000,00. A tale scopo è stata impegnata una somma di €48.510,40.

**Azione strategica n.4:**

Riequilibrio economico e sociale della zona montana:

Finalità: Con questa azione si vuole intervenire nelle aree montane degradate, favorendo la tutela, il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali locali nei Comuni montani.

*4 sub1- Riequilibrio economico e sociale del territorio del bacino montano (Giarratana, Monterosso, Chiaramonte e Ragusa*

L'intervento è finalizzato alla ricognizione territoriale di tutti quei terreni abbandonati, incolti, marginali, non agricoli per favorire gli investimenti negli imboschimenti di superfici non agricole o abbandonate con specie adatte alle condizioni locali compatibili con l'ambiente (forestazione produttiva), in modo da accrescere il valore economico, ecologico e sociale del bosco

Quota fondo ex-Insicem: €1.697.863,00

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI

Somme impegnate: €11.400,00

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente € 11.400,00 come spesa prevista per l'affidamento al Settore XVI dell'incarico per l'implementazione del Piano d'ambito montano.

Il suddetto documento "Ambito montano: indirizzi e strategie per il riequilibrio socio-economico" è in fase di approvazione.

**Azione strategica n.5:**

Istituzione di un fondo di rotazione a sostegno della capitalizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese della Provincia di Ragusa, mediante interventi sul capitale di rischio

**Finalità:** Innescare una sorta di volano di sviluppo che incida positivamente sui volumi di risorse finanziarie attivabili a sostegno della crescita economica del sistema produttivo locale.

*5 sub1- Istituzione di un fondo per la capitalizzazione delle imprese mediante interventi nel capitale di rischio*

L'intervento prevede di rafforzare la capacità finanziaria delle piccole e medie imprese, industriali, commerciali, artigiane e agricole, istituendo un fondo per l'assunzione del capitale di rischio

Quota fondo ex-Insicem: €1.940.415,85 + €1.940.415,85

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio

Responsabile per la realizzazione: -----

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato sta valutando le possibili soluzioni in merito alle procedure per gestire l'erogazione dei suddetti fondi.

*5 sub2- Istituzione di un fondo per interventi nel fondo rischi dei confidi che finanziano progetti di sviluppo*

Il fondo è finalizzato a dare una integrazione delle garanzie alle imprese con patrimonio debole che hanno grande prospettiva di sviluppo ed intendono fare investimenti a medio e lungo termine.

Quota fondo ex-Insicem: €1.940.415,85

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio

Responsabile per la realizzazione: -----

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato ha discusso e condiviso un documento di indirizzi sulle modalità di erogazione dei fondi, stabilendo altresì l'istituzione di un Organismo di garanzia per il controllo e la gestione dei fondi. Tale Organismo è stato nominato e sta procedendo per stabilire le procedure di erogazione dei fondi.

*5 sub3- Istituzione di un fondo per interventi in conto interessi*

Il fondo è finalizzato alla riduzione percentuale del tasso di mercato assunto a riferimento. L'agevolazione mira a facilitare l'accesso al credito delle PMI, riducendo il costo del denaro e quindi l'ammontare dell'esposizione che dovrà essere rimborsata

Quota fondo ex-Insicem: €1.940.415,85

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa e Camera di Commercio

Responsabile per la realizzazione: -----

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Ad oggi, il tavolo interistituzionale del partenariato ha discusso e condiviso un documento di indirizzi sulle modalità di erogazione dei fondi, stabilendo altresì l'istituzione di un Organismo di garanzia per il controllo e la gestione dei fondi. Tale Organismo è stato nominato e sta procedendo per stabilire le procedure di erogazione dei fondi.

### **Azione strategica n.6:**

Favorire l'adeguamento delle realtà produttive locali

**Finalità:** favorire la competitività, la produttività, la coesione e la qualità della vita all'interno del territorio provinciale, soddisfacendo sia la domanda di servizi espressa dalle PMI industriali ed artigianali, singole e/o associate, riguardante i temi dell'innovazione, della Società dell'informazione, della certificazione di qualità, sia la diffusione di tecnologie più pulite e delle informazioni ambientali.

*6sub3- Sostegno al centro ibleo di ricerca nei settori delle colture protette e dell'agroalimentare*

L'intervento prevede il sostegno al Centro ibleo al fine di favorire l'adozione di nuove tecnologie, l'uso di sistemi avanzati di comunicazione e di commercializzazione, l'informatizzazione dei processi produttivi, l'introduzione di tecnologie pulite e altri investimenti utili alla sicurezza e qualità dei processi produttivi e dei prodotti.

Quota fondo ex-Insicem: €873.187,13

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore I

Somme impegnate: €225.674,56

Somme erogate: € 25.000,00

Stato dell'attuazione: Ad oggi, in collaborazione col settore 19° "Edilizia patrimoniale, sportiva, scolastica", sono stati impegnati complessivamente € 225.674,56 di cui:

- € 30.674,56 per assicurare la vigilanza sull'immobile destinato al Centro di ricerca ibleo sito in c/da Perciata;
- € 150.000,00 per realizzare la sistemazione delle aree esterne del suddetto edificio. Allo stato i lavori risultano in fase di ultimazione;

- €20.000,00 per la promozione e la pubblicizzazione del Centro nell'ambito della rassegna ortofloricole Kamrinense ed Agrem;
- € 25.000,00 come cofinanziamento del Master in "Produzioni agrarie intensive per nuove esigenze di mercato".

Con Decreto Dirigenziale n.1363 del 14.12.2006 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, è stato approvato il Piano Triennale (2005-2007) con gli obiettivi e le risorse necessarie: per la realizzazione degli obiettivi programmati è stato previsto un fabbisogno triennale di 3,5 milioni di euro, di cui € 300.000 a carico dell'Università di Catania, € 900.000 a carico della Provincia di Ragusa (fondi ex-Insicem) ed il resto a carico dell'Assessorato Regionale.

Inoltre, sono in corso di definizione le procedure per la fornitura di arredi e per l'appalto di manutenzione a contratto aperto.

*5 sub4 - Sostegno di progetti di promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero*

L'intervento intende sostenere la promozione di consorzi d'impresa per il mercato estero

Quota fondo ex-Insicem: €97.020,79

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XI

Somme impegnate: -----

Somme erogate: -----

Stato dell'attuazione: Il competente settore dell'Amministrazione sta organizzando le procedure per le più idonee forme di promozione, anche avvalendosi di specialisti del settore.

**Azione strategica n.7:**

Favorire lo sviluppo socio-economico del territorio

Finalità: favorire lo sviluppo socio-economico del territorio in forma sostenibile, rafforzandone l'identità culturale umanitaria e l'attrattività per investimenti e risorse "esterne"

*Per questa azione strategica non sono state assegnate risorse a valere sui fondi ex-Insicem.*

**Azione strategica n.8:**

Favorire con sistema ed efficacia la gestione dei fondi ex-Insicem

Finalità: Provvedere alla spese necessarie per una buona e corretta attuazione, nonché gestione dei fondi.

*8 sub1- Spese per la gestione e il monitoraggio del progetto*

L'intervento prevede di provvedere alla spese necessarie per una buona e corretta attuazione, nonché gestione dei fondi

Quota fondo ex-Insicem: €94.401,23

Soggetto attuatore: Provincia regionale di Ragusa

Responsabile per la realizzazione: Dirigente settore XVI

Somme impegnate: €22.099,00

Somme erogate: € 15.351,40

Stato dell'attuazione: Ad oggi, sono stati impegnati complessivamente € 22.099,00 per:

- spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regionale dell'Accordo di Programma del 26.07.2006 di cui in premessa;
- spese per il funzionamento del nucleo operativo tecnico di cui all'art.12 dell'Accordo di programma.
- spese per il servizio di stenotipia delle sedute del tavolo del partenariato.


Fino ad ora non state riscontrate difficoltà tali da rendere necessario proporre azioni correttive.

Con riferimento alle azioni da attivare con l'impiego prioritario dei **ribassi d'asta** (art.9 dell'Accordo di programma) derivanti dall'affidamento dei lavori, si evidenzia che ad oggi risulta accantonata una somma pari ad € 265.485,78. Si registra inoltre una economia derivante dal ribasso offerto per l'affidamento di servizi, pari a €540.000,00.

**5. CONCLUSIONI**

A circa 20 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma risultano impegnate circa il 27,42% delle risorse disponibili, ed erogate il 8,60% delle somme impegnate e lo 2,36% delle risorse complessive.

Nell'evidenziare, come circa il 78% dei fondi ex-Insicem sia destinato alla riqualificazione dei collegamenti infrastrutturali e al potenziamento delle aree per insediamenti produttivi, e che, pertanto, le suddette azioni sono ritenute prioritarie per lo sviluppo del territorio, sarebbe opportuno che fosse speso il massimo impegno per la loro attuazione.

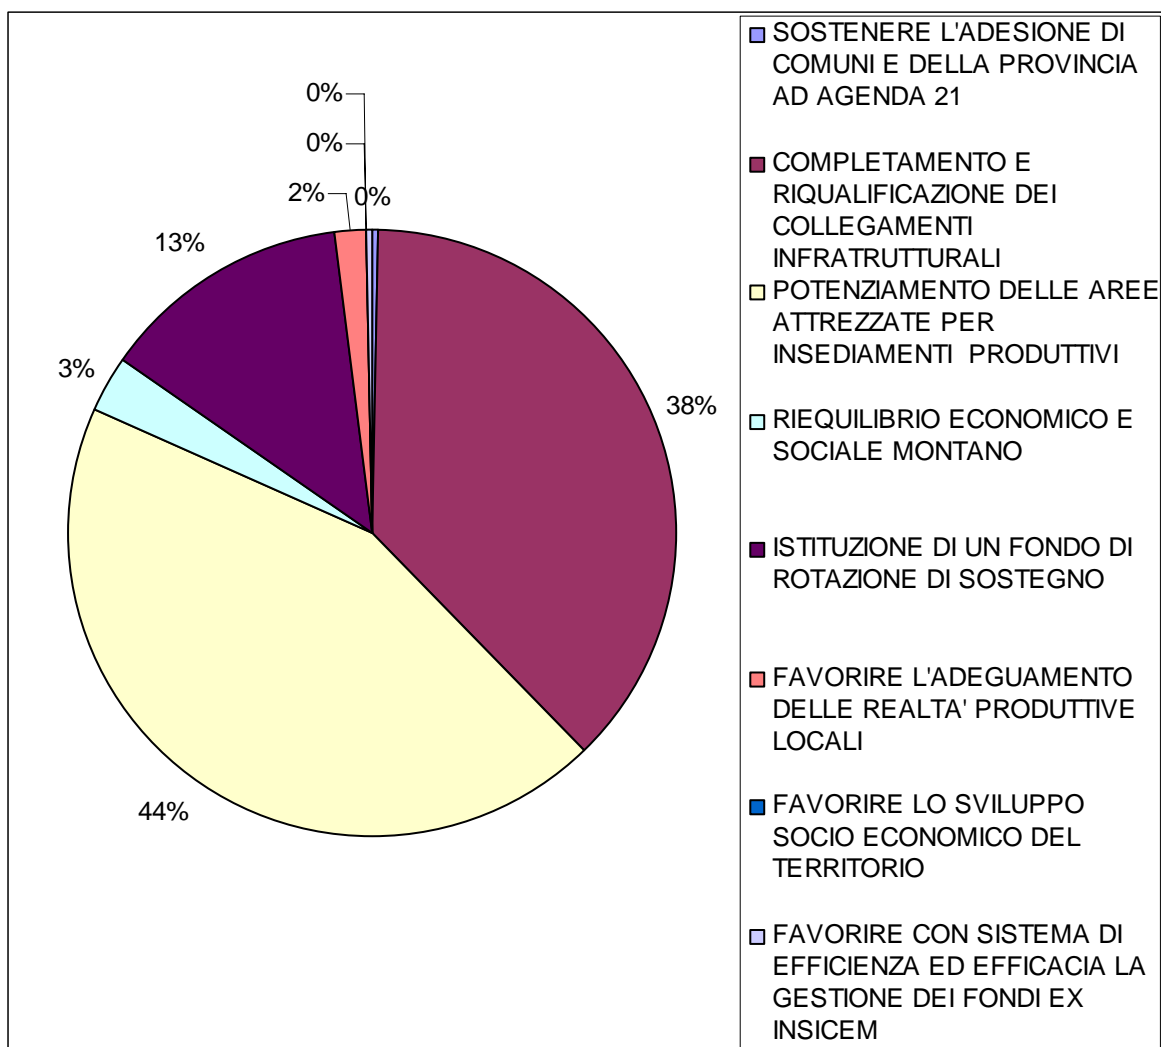

Si osserva, altresì, che per alcuni interventi, non è pervenuta alcuna notizia circa lo stato di attuazione né formalmente né informalmente e si auspica pertanto che, anche se tale fenomeno è stato registrato in misura minore, vi sia una maggiore collaborazione dei vari soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

**Il Responsabile Tecnico**  
(arch. Salvatore Distefano)

**Il Dirigente Settore 16°**  
(Ing. Vincenzo Corallo)

# ALLEGATI
